

ORIGINAL

SCHLOSSER INGENIERIA

A

COD. 01

FACTURA

Razón Social: SCHLOSSER CARLOS MARTIN

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000130

Fecha de Emisión: 24/09/2019

Domicilio Comercial: O Higgins 2096 - Bahia Blanca, Buenos Aires

CUIT: 20122122019

Ingresos Brutos: 20-12212201-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2002

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Período Facturado Desde: 24/09/2019 Hasta: 24/09/2019

Fecha de Vto. para el pago: 24/09/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

| Código | Producto / Servicio  | Cantidad | U. medida | Precio Unit. | % Bonif | Subtotal | Alicuota IVA | Subtotal c/IVA |
|--------|--|----------|-----------|--------------|---------|----------|--------------|----------------|
| 1      | Certificado N°1<br>Provision gas natural en Bahia Blanca y Gral. Cerri<br>Codigo de obra: BBL-51-12-19<br>Locacion de obra: 4500076195 | 1.00     | unidades  | 82364,98     | 0,00    | 82364,98 | 21%          | 99661,63       |

\* 03-006694-00-19  
03-006689-00-19

CODIGO DE OBRA: BBL-51-12-19  
N° PEDIDO: 4500076195  
CONCEPTO: EXTENSION RED DE GAS  
LOCALIDAD: BAHIA BLANCA - GRAL. CERRI  
N° ANTEPROYECTO: \*

PRIMA Y SELLO  
JEFE DE SECTOR

FECHA: 25/09/19

## Otros Tributos

| Descripción                           | Detalle | Alic. % | Importe |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias |         |         | 0,00    |
| Per./Ret. de IVA                      |         |         | 0,00    |
| Per./Ret. Ingresos Brutos             |         |         | 0,00    |
| Impuestos Internos                    |         |         | 0,00    |
| Impuestos Municipales                 |         |         | 0,00    |
| Importe Otros Tributos: \$            |         |         | 0,00    |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Importe Neto Gravado: \$   | 82364,98 |
| IVA 27%: \$                | 0,00     |
| IVA 21%: \$                | 17296,65 |
| IVA 10.5%: \$              | 0,00     |
| IVA 5%: \$                 | 0,00     |
| IVA 2.5%: \$               | 0,00     |
| IVA 0%: \$                 | 0,00     |
| Importe Otros Tributos: \$ | 0,00     |
| Importe Total: \$          | 99661,63 |

"De Carlos Martín Schlosser"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69399234183929



Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación


Fecha de Vto. de CAE: 04/10/2019



201221220190010000269399234183929201910049

Sol Ped - Hogo de Entrada N° 1000225172

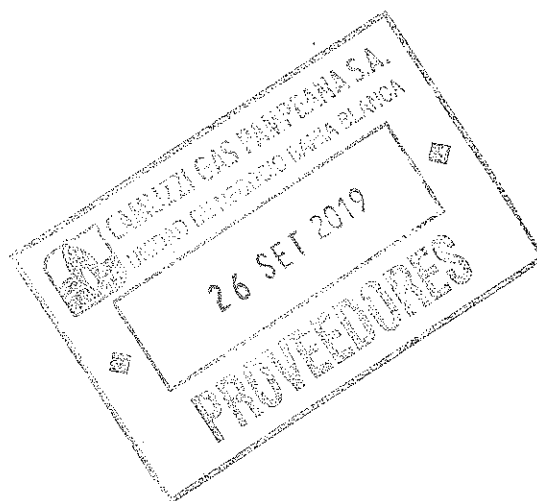



PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| OBRA:                            | PROVISIÓN GAS NATURAL EN BAHÍA BLANCA Y GRAL. CERRI |
| CÓDIGO DE OBRA:                  | BBL-51-12-19  |
| CONTRATISTA:                     | CARLOS MARTIN SCHLOSSER                             |
| LOCACION DE OBRA:                | 450076195   |
| UNIDAD DE NEGOCIO:               | BAHIA BLANCA  |
| CENTRO OPERATIVO:                | BAHIA BLANCA  |
| MONTO TOTAL DE LOCACIÓN (s/ IVA) | \$ 86.699,98  |
| CERTIFICADO N°:                  | 1   |
| PERÍODO:                         | AGO 2019  |
| FECHA:                           | 03/09/2019  |

| RUBRO  | ITEM                      | DESCRIPCIÓN  | UND. | CANT. | PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA) | PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA) | MEDICION ITEM |   |             |                     | CERTIFICADO    |              | OBS. |
|--|---------------------------|--|------|-------|------------------------------|---------------------------|---------------|---|-------------|---------------------|----------------|--------------|------|
|  |                           |  |      |       |                              |                           | ANTERIOR CANT | % | ACTUAL CANT | %                   | ACUMULADO CANT | %            |      |
| PROYECTO: 03-006689-00-19 / CÓDIGO DE OBRA: BBL-51-12-19 |                           |  |      |       |                              |                           |               |   |             |                     |                |              |      |
| I DOCUMENTACIÓN  |                           |  |      |       |                              |                           |               |   |             |                     |                |              |      |
| I.1  | I.1                       | Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)          | Gl   | 1,00  | \$ 2.167,50                  | \$ 2.167,50               |               |   | 1,00        | 100,00%             |                | \$ 2.167,50  |      |
|  | I.2                       | Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)         | Gl   | 1,00  | \$ 2.167,50                  | \$ 2.167,50               |               |   | 1,00        | 100,00%             |                | \$ 2.167,50  |      |
|  | CANERÍA DE Ø90mm - SDR 11 |  |      |       |                              |                           |               |   |             |                     |                |              |      |
| II.1   | II.1.1                    | Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)       | mts  | 25,00 | \$ 1.335,48                  | \$ 33.387,00              |               |   | 25,00       | 100,00%             |                | \$ 33.387,00 |      |
|  | II.1.2                    | Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1) | mts  | 25,00 | \$ 667,74                    | \$ 16.693,50              |               |   | 25,00       | 100,00%             |                | \$ 16.693,50 |      |
|  | II.1.3                    | Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)                        | mts  | 25,00 | \$ 222,58                    | \$ 5.564,50               |               |   | 25,00       | 100,00%             |                | \$ 5.564,50  |      |
| PRUEBA NEUMÁTICA   |                           |  |      |       |                              |                           |               |   |             |                     |                |              |      |
| III.1  | III.1                     | Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final               | mts  | 25,00 | \$ 86,70                     | \$ 2.167,50               |               |   | 25,00       | 100,00%             |                | \$ 2.167,50  |      |
| PROYECTO: 03-006694-00-19 / CÓDIGO DE OBRA: BBL-51-12-19 |                           |  |      |       |                              |                           |               |   |             |                     |                |              |      |
| I DOCUMENTACIÓN  |                           |  |      |       |                              |                           |               |   |             |                     |                |              |      |
| I.1  | I.1                       | Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)          | Gl   | 1,00  | \$ 2.167,50                  | \$ 2.167,50               |               |   | 1,00        | 100,00%             |                | \$ 2.167,50  |      |
|  | I.2                       | Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)         | Gl   | 1,00  | \$ 2.167,50                  | \$ 2.167,50               |               |   |             |                     |                | \$ -         |      |
|  | CANERÍA DE Ø50mm - SDR 11 |  |      |       |                              |                           |               |   |             |                     |                |              |      |
| II.1   | II.1.1                    | Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)       | mts  | 26,00 | \$ 416,54                    | \$ 10.830,04              |               |   | 26,00       | 100,00%             |                | \$ 10.830,04 |      |
|  | II.1.2                    | Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1) | mts  | 26,00 | \$ 208,27                    | \$ 5.415,02               |               |   | 26,00       | 100,00%             |                | \$ 5.415,02  |      |
|  | II.1.3                    | Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)                        | mts  | 26,00 | \$ 69,42                     | \$ 1.804,92               |               |   | 26,00       | 100,00%             |                | \$ 1.804,92  |      |
| PRUEBA NEUMÁTICA   |                           |  |      |       |                              |                           |               |   |             |                     |                |              |      |
| III.1  | III.1                     | Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final               | mts  | 26,00 | \$ 83,37                     | \$ 2.167,50               |               |   |             |                     |                | \$ -         |      |
| TOTAL LOCACIÓN   |                           |  |      |       | TOTAL (SIN IVA) \$           |                           | 86.699,98     |   |             | AVANCE DE OBRA: 15% |                | \$ - \$      |      |
|  |                           |  |      |       |                              |                           |               |   |             |                     |                | \$ 82.364,98 |      |

|  |  |
|--|--|
| APROBACIÓN DE LA MEDICIÓN: 16-09-19                            | APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN: 18-9-19                |
| CARLOS MARTIN SCHLOSSER<br>SCHLOSSER INGENIERIA<br>CONTRATISTA | JEFES DE NEGOCIO<br>LUCAS CAMUZZI<br>GERENCIA CGP S.A. |

|  |                   |
|--|-------------------|
| NICOLAS ALBERTO ITRIA<br>Leg. 500676<br>INSPECCIÓN DE OBRA - PROYECTOS Y OBRAS | GERENCIA CGP S.A. |
|--|-------------------|
