

PEINADO LUIS ALBERTO

A
CÓD. 201

FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Razón Social: PEINADO LUIS ALBERTO

Domicilio Comercial: Millamapu 155 - Bahía Blanca, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000005

Fecha de Emisión: 19/09/2019

CUIT: 20113417359

Ingresos Brutos: C.M.902-148468-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1996

Fecha de Vto. para el pago: 19/09/2019

Período Facturado Desde: 19/09/2019

Hasta: 19/09/2019

CBU del Emisor: 0140416001620205090959 Alias CBU: MOLDE.JARRON.POLLO

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
	"Extensión de redes en Bahía Blanca " CODIGO DE OBRA: BBL-51-14-18; BBL-51-17-18; BBL-51-18-18; BBL-51-16-18; BBL-20-18 LOCACION DE OBRA: 4500071070 Certificado nro. 6	1,00	otras unidades	127540,20	0,00	127540,20	21%	154323,64

NELSON D. GARAY
JEFE ÁREA TÉCNICA
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CODIGO DE OBRA: BBL-51-20-18
Nº PEDIDO: 4500071070
CONCEPTO: EXTENSION DE RED
LOCALIDAD: PUNTA ALTA
Nº ANTEPROYECTO: 03-006605-00-18

ADOLFO ETULAIN

L/37895

FIRMA Y SELLO
JEFE DE SECTOR

FECHA: 19-09-19

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alíq. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
	Importe Otros Tributos: \$		0,00

Importe Neto Gravado: \$	127540,20
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	26783,44
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	154323,64

SON \$ CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS CON 64/100



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69389054199574



Fecha de Vto. de CAE: 19/09/2019

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



201134173592010000269389054199574201909195

Hoja de Entrega N° 1000225053

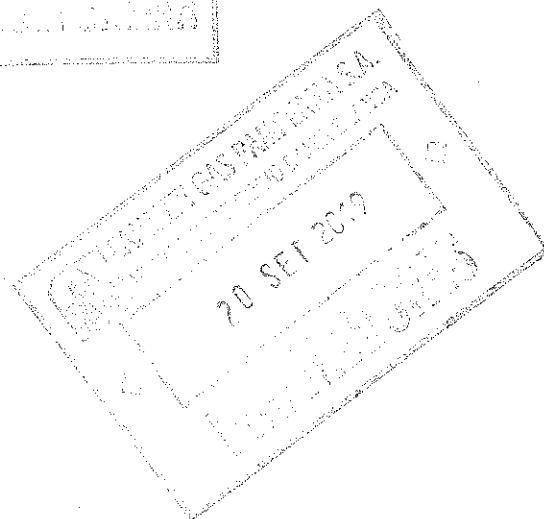

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA: "Extensión de redes en Bahía Blanca"

CODIGO DE OBRA: BBL-51-14-18; BBL-51-17-18; BBL-51-18-18; BBL-51-19-18; BBL-51-20-18

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO PEINADO

LOCACION DE OBRA: 4500071070

UNIDAD DE NEGOCIO:

CENTRO OPERATIVO:

MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 1.710.602,00

BAHIA BLANCA

BAHIA BLANCA

MEDICION / CERTIFICADO Nº 6

(ULTIMO)

PERIODO: AGOSTO 2019

FECHA: 06/09/2019

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO			
							ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL	
							CANT	%	CANT	%	CANT	%	CANT	%
1	BBL-51-14-18 / ANTEPROYECTO N° 03-005588-00-18													
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 1.026,50	\$ 1.026,50	1	100,00%	1	100,00%	1.026,50		1.026,50	
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$ 8.500,00	\$ 8.500,00	1	100,00%	1	100,00%	8.500,00		8.500,00	
	1.3.1	Cañería de Ø50mm - SDR 11												
	1.3.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	70	\$ 720,00	\$ 50.400,00	70,03	100,04%	70,03	100,04%	50.421,60		50.421,60	
	1.3.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	70	\$ 360,00	\$ 25.200,00	70,03	100,04%	70,03	100,04%	25.210,80		25.210,80	
	1.3.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	70	\$ 120,00	\$ 8.400,00	70,03	100,04%	70,03	100,04%	8.403,60		8.403,60	
	1.3.2	Cañería de Ø63mm - SDR 11												
	1.3.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	47	\$ 918,60	\$ 43.174,20	49,73	105,81%	49,73	105,81%	45.681,98		45.681,98	
	1.3.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	47	\$ 459,30	\$ 21.587,10	49,73	105,81%	49,73	105,81%	22.840,99		22.840,99	
	1.3.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	47	\$ 153,10	\$ 7.195,70	49,73	105,81%	49,73	105,81%	7.613,66		7.613,66	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	1	100,00%	1	100,00%	1.500,00		1.500,00	
	2	BBL-51-14-18 / ANTEPROYECTO N° 03-006075-00-18												
		1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 7.726,09	\$ 7.726,09	1	100,00%	1	100,00%	7.726,09		7.726,09
1.2		Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	1	100,00%	1	100,00%	12.000,00		12.000,00	
1.3.1		Cañería de Ø50mm - SDR 11												
1.3.1.1		Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	17	\$ 720,00	\$ 12.240,00	15,16	89,18%	15,16	89,18%	10.915,20		10.915,20	
1.3.1.2		Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	17	\$ 360,00	\$ 6.120,00	15,16	89,18%	15,16	89,18%	5.457,60		5.457,60	
1.3.1.3		Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	17	\$ 120,00	\$ 2.040,00	15,16	89,18%	15,16	89,18%	1.819,20		1.819,20	
1.3.2		Cañería de Ø63mm - SDR 11												
1.3.2.1		Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	113	\$ 990,00	\$ 111.870,00	114,48	101,31%	114,48	101,31%	113.335,20		113.335,20	
1.3.2.2		Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	113	\$ 495,00	\$ 55.935,00	114,48	101,31%	114,48	101,31%	56.667,60		56.667,60	
1.3.2.3		Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	113	\$ 165,00	\$ 18.645,00	114,48	101,31%	114,48	101,31%	18.889,20		18.889,20	
1.4		Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	1	100,00%	1	100,00%	2.500,00		2.500,00	
3		BBL-51-14-18 / ANTEPROYECTO N° 03-005596-00-18												
		1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 1.200,00	\$ 1.200,00	1	100,00%	1	100,00%	1.200,00		1.200,00
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	1	100,00%	1	100,00%	1.500,00		1.500,00	
	1.3.1	Cañería de Ø50mm - SDR 11												
	1.3.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	2	\$ 720,00	\$ 1.440,00	3,83	1,92	3,83	191,50%	2.757,60		2.757,60	
	1.3.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	2	\$ 360,00	\$ 720,00	3,83	1,92	3,83	191,50%	1.378,80		1.378,80	
	1.3.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	2	\$ 120,00	\$ 240,00	3,83	1,92	3,83	191,50%	459,60		459,60	
	1.3.2	Cañería de Ø63mm - SDR 11												
	1.3.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	16	\$ 765,77	\$ 12.252,32	17,12	1,07	17,12	107,00%	13.109,98		13.109,98	
	1.3.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	16	\$ 382,88	\$ 6.126,08	17,12	1,07	17,12	107,00%	6.554,91		6.554,91	
	1.3.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	16	\$ 127,63	\$ 2.042,08	17,12	1,07	17,12	107,00%	2.185,03		2.185,03	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	1	100,00%	1	100,00%	1.500,00		1.500,00	

ING. LUIS
ALBERTO
PEINADO



PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

OBRA: "Extensión de redes en Bahía Blanca"		UNIDAD DE NEGOCIO: BAHIA BLANCA		MEDICION / CERTIFICADO N° 6	
CODIGO DE OBRA: BBL-51-14-18; BBL-51-17-18; BBL-51-18-18; BBL-51-16-18; BBL-51-20-18		CENTRO OPERATIVO: BAHIA BLANCA		(ULTIMO)	
CONTRATISTA: LUIS ALBERTO PEINADO		MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 1.710.602,00		PERIODO: AGOSTO 2019	
LOCALIDAD DE OBRA: 4500071070				FECHA: 06/09/2019	

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO				OBS.
							ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL		
4 BBL-51-17-18 / ANTEPROYECTO N° 03-006513-00-18															
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 4.060,00	\$ 4.060,00	1	100,00%			1	100,00%	4.060,00	4.060,00	
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$ 6.742,50	\$ 6.742,50	1	100,00%			1	100,00%	6.742,50	6.742,50	
	1.3	Cañería de 250mm - SDR 11													
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	74	\$ 720,00	\$ 53.280,00	98,47	133,07%			98,47	133,07%	70.898,40	70.898,40	
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	74	\$ 360,00	\$ 26.640,00	98,47	133,07%			98,47	133,07%	35.449,20	35.449,20	
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	74	\$ 120,00	\$ 8.880,00	98,47	133,07%			98,47	133,07%	11.816,40	11.816,40	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	1	100,00%			1	100,00%	1.500,00	1.500,00	
5 BBL-51-17-18 / ANTEPROYECTO N° 03-006542-00-18															
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 1.155,00	\$ 1.155,00	1	100,00%			1	100,00%	1.155,00	1.155,00	
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	1	100,00%			1	100,00%	2.000,00	2.000,00	
	1.3	Cañería de 250mm - SDR 11													
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	28	\$ 720,00	\$ 20.160,00	28,00	100,00%			28,00	100,00%	20.160,00	20.160,00	
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	28	\$ 360,00	\$ 10.080,00	28,00	100,00%			28,00	100,00%	10.080,00	10.080,00	
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	28	\$ 120,00	\$ 3.360,00	28,00	100,00%			28,00	100,00%	3.360,00	3.360,00	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	1	100,00%			1	100,00%	1.500,00	1.500,00	
6 BBL-51-17-18 / ANTEPROYECTO N° 03-006597-00-18															
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 2.148,75	\$ 2.148,75	1	100,00%			1	100,00%	2.148,75	2.148,75	
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00	1	100,00%			1	100,00%	3.500,00	3.500,00	
	1.3	Cañería de 250mm - SDR 11													
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	43	\$ 720,00	\$ 30.960,00	43,00	100,00%			43,00	100,00%	30.960,00	30.960,00	
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	43	\$ 360,00	\$ 15.480,00	43,00	100,00%			43,00	100,00%	15.480,00	15.480,00	
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	43	\$ 120,00	\$ 5.160,00	43,00	100,00%			43,00	100,00%	5.160,00	5.160,00	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	1	100,00%			1	100,00%	1.500,00	1.500,00	
7 BBL-51-17-18 / ANTEPROYECTO N° 03-006571-00-18															
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 145,12	\$ 145,12	1	100,00%			1	100,00%	145,12	145,12	
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$ 900,00	\$ 900,00	1	100,00%			1	100,00%	900,00	900,00	
	1.3	Cañería de 250mm - SDR 11													
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	9	\$ 990,00	\$ 8.910,00	8,66	96,22%			8,66	96,22%	8.573,40	8.573,40	
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	9	\$ 495,00	\$ 4.455,00	8,66	96,22%			8,66	96,22%	4.286,70	4.286,70	
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	9	\$ 165,00	\$ 1.485,00	8,66	96,22%			8,66	96,22%	1.428,90	1.428,90	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 500,00	\$ 500,00	1	100,00%			1	100,00%	500,00	500,00	

EMPRESA CONSTRUCTORA
Ing. LUIS ALBERTO PEINADO
C.T. 11111111
N° 500676

ING. LUIS
ALBERTO
PEINADO

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA: "Extensión de redes en Bahía Blanca"

CODIGO DE OBRA: BBL-51-14-18; BBL-51-17-18; BBL-51-18-18; BBL-51-20-18

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO PEINADO

LOCACION DE OBRA: 4500071070

UNIDAD DE NEGOCIO:

CENTRO OPERATIVO:

MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 1.710.602,00

BAHIA BLANCA

BAHIA BLANCA

MEDICION / CERTIFICADO Nº 6

PERIODO: AGOSTO 2019

FECHA: 06/09/2019

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO		OBS.
							ANTERIOR	%	CANT	%	ANTERIOR	ACTUAL	
9													
BBL-51-17-18 / ANTEPROYECTO N° 03-2065608-00-18													
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	Gl	1	\$ 1.155,00	\$ 1.155,00	1	100,00%			1	100,00%	1.155,00
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	Gl	1	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	1	100,00%			1	100,00%	2.000,00
	1.3	Cañería de 250mm - SDR 11											
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	28	\$ 720,00	\$ 20.160,00	29,50	105,36%			29,50	105,36%	21.240,00
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	28	\$ 360,00	\$ 10.080,00	29,50	105,36%			29,50	105,36%	10.620,00
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	28	\$ 120,00	\$ 3.360,00	29,50	105,36%			29,50	105,36%	3.540,00
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	1	100,00%			1	100,00%	1.500,00
BBL-51-17-18 / ANTEPROYECTO N° 03-2065608-00-18													
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	Gl	1	\$ 261,25	\$ 261,25	1	100,00%			1	100,00%	261,25
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	Gl	1	\$ 900,00	\$ 900,00	1	100,00%			1	100,00%	900,00
	1.3	Cañería de 250mm - SDR 11											
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	13	\$ 720,00	\$ 9.360,00	13,00	100,00%			13,00	100,00%	9.360,00
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	13	\$ 360,00	\$ 4.680,00	13,00	100,00%			13,00	100,00%	4.680,00
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	13	\$ 120,00	\$ 1.560,00	13,00	100,00%			13,00	100,00%	1.560,00
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	1	100,00%			1	100,00%	1.000,00
BBL-51-17-18 / ANTEPROYECTO N° 03-2065793-00-18													
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	Gl	1	\$ 3.700,00	\$ 3.700,00	1	100,00%			1	100,00%	3.700,00
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	Gl	1	\$ 8.044,92	\$ 8.044,92	1	100,00%			1	100,00%	8.044,92
	1.3	Cañería de 250mm - SDR 11											
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	61	\$ 765,77	\$ 46.711,97	70	115,08%			70,20	115,08%	53.757,05
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	61	\$ 382,88	\$ 23.395,68	70	115,08%			70,20	115,08%	26.878,18
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	61	\$ 127,63	\$ 7.785,43	70	115,08%			70,20	115,08%	8.959,63
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	1	100,00%			1	100,00%	3.000,00
BBL-51-18-18 / ANTEPROYECTO N° 03-2065281-00-18													
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	Gl	1	\$ 1.620,00	\$ 1.620,00	1	100,00%			1	100,00%	1.620,00
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	Gl	1	\$ 2.200,00	\$ 2.200,00	1	100,00%			1	100,00%	2.200,00
	1.3	Cañería de 250mm - SDR 11											
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	32	\$ 720,00	\$ 23.040,00	32,00	100,00%			32,00	100,00%	23.040,00
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	32	\$ 360,00	\$ 11.520,00	32,00	100,00%			32,00	100,00%	11.520,00
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	32	\$ 120,00	\$ 3.840,00	32,00	100,00%			32,00	100,00%	3.840,00
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	1	100,00%			1	100,00%	1.500,00

EMPRESA CONSTRUCTORA
Ing. LUIS ALBERTO PEINADO
TITULAR

NICOLAS ALBERTO ITRIA
Leg. 500676

ING. LUIS
ALBERTO
PEINADO

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA: "Extensión de redes en Bahía Blanca"

CODIGO DE OBRA: BBL-51-14-18; BBL-51-17-18; BBL-51-18-18; BBL-51-19-18; BBL-51-20-18

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO PEINADO

LOCACION DE OBRA: 4500071070

UNIDAD DE NEGOCIO:

BAHIA BLANCA

CENTRO OPERATIVO:

BAHIA BLANCA

MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 1.710.602,00

MEDICION / CERTIFICADO N° 6

(ULTIMO)

PERIODO: AGOSTO 2019

FECHA: 06/09/2019

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO			
							ANTERIOR	%	CANT	%	ANTERIOR	%	ACUMULADO	OBS.
12		BBL-51-18-18 / ANTEPROYECTO N° 03-005144-00-18												
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 8.087,25	\$ 8.087,25	1	100,00%	1	100,00%	8.087,25	100,00%	8.087,25	
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$ 29.200,00	\$ 29.200,00	1	100,00%	1	100,00%	29.200,00	100,00%	29.200,00	
	1.3.1	Cañería de 250mm - SDR 11												
	1.3.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	93	\$ 720,00	\$ 66.960,00	93,08	103,31%	93,08	103,31%	69.177,60	103,31%	69.177,60	
	1.3.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	93	\$ 360,00	\$ 33.480,00	93,08	103,31%	93,08	103,31%	34.588,80	103,31%	34.588,80	
	1.3.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	93	\$ 120,00	\$ 11.160,00	93,08	103,31%	93,08	103,31%	11.529,60	103,31%	11.529,60	
	1.3.2	Cañería de 250mm - SDR 11												
	1.3.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	107	\$ 780,00	\$ 83.460,00	105,49	98,59%	105,49	98,59%	82.282,20	98,59%	82.282,20	
	1.3.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	107	\$ 390,00	\$ 41.730,00	105,49	98,59%	105,49	98,59%	41.141,10	98,59%	41.141,10	
	1.3.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	107	\$ 130,00	\$ 13.910,00	105,49	98,59%	105,49	98,59%	13.713,70	98,59%	13.713,70	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	1	100,00%	1	100,00%	1.500,00	100,00%	1.500,00	
13		BBL-51-18-18 / ANTEPROYECTO N° 03-005144-00-18												
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 4.848,00	\$ 4.848,00	1	100,00%	1	100,00%	4.848,00	100,00%	4.848,00	
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$ 7.000,00	\$ 7.000,00	1	100,00%	1	100,00%	7.000,00	100,00%	7.000,00	
	1.3.1	Cañería de 250mm - SDR 11												
	1.3.1.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	84	\$ 720,00	\$ 60.480,00	85,20	101,43%	85,20	101,43%	61.344,00	101,43%	61.344,00	
	1.3.1.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	84	\$ 360,00	\$ 30.240,00	85,20	101,43%	85,20	101,43%	30.672,00	101,43%	30.672,00	
	1.3.1.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	84	\$ 120,00	\$ 10.080,00	85,20	101,43%	85,20	101,43%	10.224,00	101,43%	10.224,00	
	1.3.2	Cañería de 250mm - SDR 11												
	1.3.2.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	9	\$ 918,60	\$ 8.267,40	7,36	81,78%	7,36	81,78%	6.760,90	81,78%	6.760,90	
	1.3.2.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	9	\$ 459,30	\$ 4.133,70	7,36	81,78%	7,36	81,78%	3.380,45	81,78%	3.380,45	
	1.3.2.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	9	\$ 153,10	\$ 1.377,90	7,36	81,78%	7,36	81,78%	1.126,82	81,78%	1.126,82	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	1	100,00%	1	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	
14		BBL-51-18-18 / ANTEPROYECTO N° 03-005144-00-18												
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	1	100,00%	1	100,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	GL	1	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	1	100,00%	1	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	
	1.3	Cañería de 250mm - SDR 11												
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	50	\$ 1.014,00	\$ 50.700,00	51,72	103,44%	51,72	103,44%	52.444,08	103,44%	52.444,08	
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	50	\$ 507,00	\$ 25.350,00	51,72	103,44%	51,72	103,44%	26.222,04	103,44%	26.222,04	
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	50	\$ 169,00	\$ 8.450,00	51,72	103,44%	51,72	103,44%	8.740,68	103,44%	8.740,68	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	1	100,00%	1	100,00%	2.500,00	100,00%	2.500,00	

EMPRESA CONSTRUCTORA
Ing. LUIS ALBERTO PEINADO
TITULAR

NICOLAS ALBERTO ITRIA
Leg. 500676

ING. LUIS
ALBERTO
PEINADO



PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

OBRA: "Extensión de redes en Bahía Blanca"

CODIGO DE OBRA: BBL-51-14-18; BBL-51-17-18; BBL-51-18-18; BBL-51-20-18

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO PEINADO

LOCACION DE OBRA: 4500071070

UNIDAD DE NEGOCIO:

CENTRO OPERATIVO:

MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 1.710.602,00

BAHIA BLANCA

BAHIA BLANCA

\$ 1.710.602,00

MEDICION / CERTIFICADO N° 6

PERIODO: AGOSTO 2019

FECHA: 06/09/2019

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO		OBS.	
							ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR \$	ACTUAL \$		
							CANT	%	CANT	%				
15	BBL-51-20-18 / ANTEPROYECTO N° 03-006505-00-18													
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	Gl	1	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	1	100,00%			1	100,00%		1.000,00
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	Gl	1	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	1	100,00%			1	100,00%		2.000,00
	1.3	Cañería de Ø250mm - SDR 11												
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	17	\$ 850,80	\$ 14.463,60	19,00	111,76%			19,00	111,76%	16.165,20	16.165,20
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	17	\$ 425,40	\$ 7.231,80	19,00	111,76%			19,00	111,76%	8.082,60	8.082,60
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	17	\$ 141,80	\$ 2.410,60	19,00	111,76%			19,00	111,76%	2.694,20	2.694,20
1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00	1	100,00%			1	100,00%	1.800,00	1.800,00	
16	BBL-51-20-18 / ANTEPROYECTO N° 03-006523-00-18													
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	Gl	1	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	1	100,00%			1	100,00%	1.500,00	1.500,00
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	Gl	1	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	1	100,00%			1	100,00%	10.000,00	10.000,00
	1.3	Cañería de Ø250mm - SDR 11												
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	124	\$ 816,00	\$ 101.184,00	122,00	98,39%			122,00	98,39%	99.552,00	99.552,00
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	124	\$ 408,00	\$ 50.592,00	122,00	98,39%			122,00	98,39%	49.776,00	49.776,00
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	124	\$ 136,00	\$ 16.864,00	122,00	98,39%			122,00	98,39%	16.592,00	16.592,00
1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	1	100,00%			1	100,00%	2.500,00	2.500,00	
17	BBL-51-20-18 / ANTEPROYECTO N° 03-006505-00-18													
	1.1	Proyecto Constructivo (según Art. III-1.1 del Pliego)	Gl	1	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00			1	100,00%			3.500,00	3.500,00
	1.2	Planos conforme a obra (según Art. III-1.2 del Pliego)	Gl	1	\$ 8.500,00	\$ 8.500,00			1	100,00%			8.500,00	8.500,00
	1.3	Cañería de Ø250mm - SDR 11												
	1.3.1	Fusionado, bajado a zanja y tapado (60% del ítem II.1.1)	mts	71	\$ 1.203,60	\$ 85.455,60					56,70	79,86%	68.244,12	68.244,12
	1.3.2	Reparación contrapiso vereda y pavimento (30% del ítem II.1.1)	mts	71	\$ 601,80	\$ 42.727,80					56,70	79,86%	34.122,06	34.122,06
	1.3.3	Conformidad Entes (10% del ítem II.1.1)	mts	71	\$ 200,80	\$ 14.242,60					56,70	79,86%	11.374,02	11.374,02
1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00					1	100,00%	1.800,00	1.800,00	
					TOTAL SIN IVA	\$ 1.710.602	AVANCE DE OBRA: 101,49%					\$ 1.608.480,74	\$ 127.540,20	\$ 1.736.020,94

APROBACIÓN DE LA MEDICION

Fecha: 13/09/19

EMPRESA CONSTRUCTORA
Ing. LUIS ALBERTO PEINADO
TITULAR

CONTRATISTA

NICOLAS ALBERTO ITRIA
Ing. 4500676

INSPECTOR

APROBACIÓN DEL CERTIFICADO

Fecha: 13/09/19

ING. LUIS ALBERTO PEINADO
JEFE AREA TECNICA
UNIDAD DE NEGOCIO BAHIA BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

JEFE TÉCNICO UNIDAD DE NEGOCIO

JOSE LUIS DAMIANI
GERENTE
UNIDAD DE NEGOCIO BAHIA BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO
