

ORIGINAL

**GALARZA CARLOS  
ALBERTO****A**  
COD. 01**FACTURA**

Razón Social: GALARZA CARLOS ALBERTO

Domicilio Comercial: Dinamarca 635 - Tandil, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000086

Fecha de Emisión: 01/07/2019

CUIT: 20241041795

Ingresos Brutos: 20241041795

Fecha de Inicio de Actividades: 01/04/2016

Período Facturado Desde: 01/07/2019

Hasta: 01/07/2019

Fecha de Vto. para el pago: 01/07/2019

CUIT: 30657864281



Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
1	Locación de servicio N°4500075906 Obra Extensión de red de distribución en Tandil. - Obra BAC-01/19 Certificado N° 1.-	1,00	unidades	181400,00	0,00	181400,00	21%	219494,00



## Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00
Importe Neto Gravado: \$			181400,00
IVA 27%: \$			0,00
IVA 21%: \$			38094,00
IVA 10.5%: \$			0,00
IVA 5%: \$			0,00
IVA 2.5%: \$			0,00
IVA 0%: \$			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00
Importe Total: \$			219494,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1


CAE N°: 69265352051718

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 11/07/2019



202410417950010000269265352051718201907111



OBRA: INSTALACION CAÑERIA - OBRA TAN-51-02-19  
 CONTRATISTA: GALARZA CARLOS  
 N° DE LOCACION DE SERVICIO: 4500075906

MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 2.134.000


JUNIO DE 2019

FECHA: 28-jun-19

MEDICION / CERTIFICADO N°: 1

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	%	%	MEDICION ITEM				MEDICION RIESGO				MEDICION OBRA				CERTIFICADO	
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		%	%	%	%	%	%	%	%	ANTERIOR	ACTUAL
								CANT	%	CANT	%	CANT	%	ANT	ACT	ACUM	ANT	ACT	ACUM		
1	PROVISION DE MANO DE MATERIALES Y MANO				\$2.134.000,00																
DE OBRA SEGUN DETALLE:																					
1	Provisión materiales y mano de obra, ejecución de extensión de red y prueba hasta condición mecánicamente terminada, Parte 8217	U	1	\$596.700	\$596.700,00	27,96%	27,96%	0	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00	\$0,00
2	Provisión materiales y mano de obra, ejecución de extensión de red y prueba hasta condición mecánicamente terminada, Parte 8355	U	1	\$299.700	\$299.700,00	14,04%	14,04%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00	\$0,00
3	Provisión materiales y mano de obra, ejecución de extensión de red y prueba hasta condición mecánicamente terminada, Parte 8362	U	1	\$873.500	\$873.500,00	40,93%	40,93%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00	\$0,00
4	Provisión materiales y mano de obra, ejecución de extensión de red y prueba hasta condición mecánicamente terminada, Parte 8365	U	1	\$65.000	\$65.000,00	3,05%	3,05%	0	0,00%	1	100,00%	1	100,00%	0,00%	3,05%	3,05%	0,00%	3,05%	3,05%	\$0,00	\$65.000,00
5	Provisión materiales y mano de obra, ejecución de extensión de red y prueba hasta condición mecánicamente terminada, Parte 8374	U	1	\$29.800	\$29.800,00	1,40%	1,40%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00	\$0,00
6	Provisión materiales y mano de obra, ejecución de extensión de red y prueba hasta condición mecánicamente terminada, Parte 8360	U	1	\$116.400	\$116.400,00			0	0,00%	1	100,00%	1	100,00%	0,00%	5,45%	5,45%	0,00%	5,45%	5,45%	\$0,00	\$116.400,00
7	Provisión materiales y mano de obra, ejecución de extensión de red y prueba hasta condición mecánicamente terminada, Parte 8357	U	1	\$152.800	\$152.800,00	7,16%	7,16%	0	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	\$0,00	\$0,00
				TOTAL ES:		\$2.134.000,00														\$0,00	\$181.400,00


APROBO: CONTRATISTA

  
**CARLOS A. GALARZA**  
 TÉCNICO MECÁNICO ELECTRICISTA  
 MAT. 1794102  
 DINAMARCA 635 - TANDIL  
 TEL. 444 5398

APROBO: MAXIMILIANO LAMAS

  
 APROBO PABLO PETERSEN  
**PABLO N. PETERSEN**  
 Jefe Técnico C.O.T  
 CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

  
 APROBO MICOLAS FERNANDEZ  
**PABLO N. PETERSEN**  
 Jefe Técnico C.O.T  
 CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

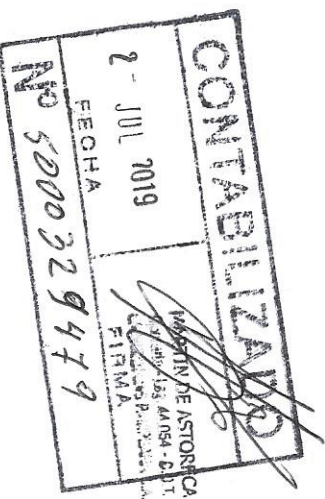



# **Estadística de Accidentes de Trabajo**

Centro Operativo: TANDIL

Resp. de la Información: CARLOS GALARZA / JULIO C. MUÑOZ

Período: JUNIO 2019

Personal	Cantidad de Personal	Horas Hombre Trabajadas	Cantidad de Accidentes Personales						Dias perdidos (Por Accidentes Con Dias Perd) [7]	Accidentes In-itinere	
			Sin Dias Perdidos			Total	Con Dias Perdidos	Fatales		Cantidad	Dias Perdidos
			1º Auxilios	Tratamiento médico	Tareas Restringidas						
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
Operaciones	3	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administración	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	3	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACCIDENTES VEHICULARES						
Cantidad de vehículos	Cantidad Accidentes	Km. Recorridos	Días Fuera de Servicio	Personal Accidentado	Días Perdidos	
[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	
3	-	2000	-	-	-	

**CARLOS A. GALARZA**  
TÉCNICO MECÁNICO E LECTRICISTA  
M.B.T. 13402  
DINAMARCA 035 - TANDIL  
TEL. 444 5308

**JULIO CESAR MUÑOZ**  
INGENIERO MECÁNICO  
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
LEY NACIONAL N° 19587 - INS. N° 317  
LEY PROVINCIAL N° 11459 - INSC. N° 1023
