

PEINADO LUIS ALBERTO

A
CÓD. 201

FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Razón Social: PEINADO LUIS ALBERTO

Domicilio Comercial: Millamapu 155 - Bahía Blanca, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000004

Fecha de Emisión: 19/09/2019

CUIT: 20113417359

Ingresos Brutos: C.M.902-148468-1

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1996

Fecha de Vto. para el pago: 19/09/2019

Período Facturado Desde: 19/09/2019

Hasta: 19/09/2019

CBU del Emisor: 0140416001620205090959 Alias CBU: MOLDE.JARRON.POLLO

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alícuota IVA	Subtotal c/IVA
--------	---------------------	----------	-----------	--------------	---------	----------	--------------	----------------

"Extensión de red de gas natural a varias calles de Bahía Blanca"
CODIGO DE OBRA: BBL-51-01-19 / BBL-51-02-19
LOCACION DE OBRA: 4500073894
Certificado nro. 3

1,00 otras unidades

189068,80 0,00 189068,80 21% 228773,25

NELSON D. GARAY
JEFE ÁREA TÉCNICA
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CODIGO DE OBRA: BBL-51-02-19
Nº PEDIDO: 4500073894
CONCEPTO: EXTENSION DE RED
LOCALIDAD: BURATOVICHA
Nº ANTEPROYECTO: 03-006625-00-18

ADOLFO ETULAIN
L/37895

FIRMA Y SELLO
JEFE DE SECTOR

FECHA: 19-09-19

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alícuota %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$ 189068,80

IVA 27%: \$ 0,00

IVA 21%: \$ 39704,45

IVA 10.5%: \$ 0,00

IVA 5%: \$ 0,00


IVA 2.5%: \$ 0,00

IVA 0%: \$ 0,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 228773,25

SON \$ DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 25/100



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69389054128640


Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Fecha de Vto. de CAE: 19/09/2019



201134173592010000269389054128640201909199

Hoja de Entradas N° 200225060

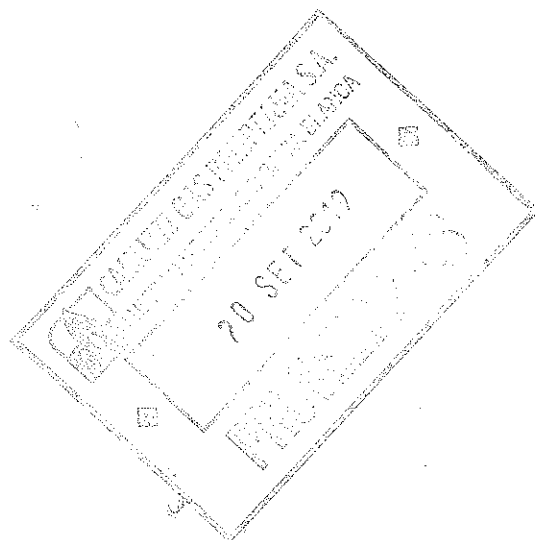

ING. LUIS
ALBERTO
PEINADO

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



OBRA:

"Extensión de red de gas natural a varias calles de Bahía Blanca"

CODIGO DE OBRA: BBL-51-01-19 / BBL-51-02-19

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO PEINADO

LOCACION DE OBRA: 4500073894

UNIDAD DE NEGOCIO:

BAHIA BLANCA

CENTRO OPERATIVO:

BAHIA BLANCA

MONTO TOTAL DE OBRA (\$/IVA) \$ 2.089.450,00

MEDICION / CERTIFICADO N° 3

(ULTIMO)

PERIODO: Agosto 2019

FECHA: 06/09/2019

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO					
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	OBS.
							CANT	%	CANT	%	CANT	%				
1	BBL-51-01-19 ANTEPROYECTO N° 03-006528-00-18															
	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego)	Gl	1	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00				1	100,00%		\$ 5.000,00			
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Gl	1	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00				1	100,00%		\$ 6.000,00			
	1.3.1	Cañería de Ø50mm - SDR 11	mts	54	\$ 1.280,00	\$ 69.120,00				54,67	101,24%		\$ 69.977,60			
	1.3.2	Cañería de Ø90mm - SDR 11	mts	11	\$ 1.300,00	\$ 14.300,00				12,00	109,09%		\$ 15.600,00			
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00				1	100,00%		\$ 10.000,00			
2	BBL-51-01-19 ANTEPROYECTO N° 03-006515-00-18															
	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego)	Gl	1	\$ 9.000,00	\$ 9.000,00				1	100,00%		\$ 9.000,00			
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Gl	1	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00				1	100,00%		\$ 15.000,00			
	1.3.1	Cañería de Ø 50 mm SDR 11	mts	114	\$ 1.264,00	\$ 144.096,00				125,90	110,44%		\$ 159.137,60			
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00				1	100,00%		\$ 15.000,00			
3	BBL-51-01-19 ANTEPROYECTO N° 03-006552-00-19															
	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego)	Gl	1	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00				1	100,00%		\$ 1.500,00			
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	Gl	1	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00				1	100,00%		\$ 2.500,00			
	1.3.1	Cañería de Ø50mm - SDR 11	mts	23	\$ 1.215,00	\$ 27.945,00				23,00	100,00%		\$ 27.945,00			
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00				1	100,00%		\$ 5.000,00			

EMPRESA CONSTRUCTORA
ING. LUIS ALBERTO PEINADO
TITULAR

NICOLAS ALBERTO ITRIA
Leg. 500676

ING. LUIS
ALBERTO
PEINADO

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA



"Extensión de red de gas natural a varias calles de Bahía Blanca"

OBRA: MEDICION / CERTIFICADO Nº 3
UNIDAD DE NEGOCIO: BAHIA BLANCA
CENTRO OPERATIVO: BAHIA BLANCA
PERIODO: Agosto 2019
FECHA: 06/09/2019
MONTO TOTAL DE OBRA (\$ IVA) \$ 2.089.450,00

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM				CERTIFICADO				OBS.
							ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL		
							CANT	%	CANT	%	\$	%	\$	%	
BBL-51-01-19-AN-PROYECTO N° 03-00653-00-13															
	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	1	100,00%				1	100,00%	\$ 4.000,00	
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	GL	1	\$ 5.500,00	\$ 5.500,00	1	100,00%				1	100,00%	\$ 5.500,00	
	1.3.1	Cañería de Ø50mm - SDR 11	mts	21	\$ 1.187,00	\$ 24.927,00	21,04	100,19%				21,04	100,19%	\$ 24.974,48	
	1.3.2	Cañería de Ø63mm - SDR 11	mts	35	\$ 1.300,00	\$ 45.500,00	35,00	100,00%				35,00	100,00%	\$ 45.500,00	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	1	100,00%				1	100,00%	\$ 10.000,00	
BBL-51-01-19-AN-PROYECTO N° 03-00637-00-17															
	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00	1	100,00%				1	100,00%	\$ 35.000,00	
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	GL	1	\$ 45.000,00	\$ 45.000,00	1	100,00%				1	100,00%	\$ 45.000,00	
	1.3.1	Cañería de Ø50mm - SDR 11	mts	325	\$ 1.316,00	\$ 427.700,00	315,36	97,03%				315,36	97,03%	\$ 415.013,76	
	1.3.2	Cañería de Ø90mm - SDR 11	mts	120	\$ 1.600,00	\$ 192.000,00	122,29	101,91%				122,29	101,91%	\$ 195.664,00	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	1	100,00%				1	100,00%	\$ 10.000,00	
BBL-51-01-19-AN-PROYECTO N° 03-00560-00-14															
	1.1	Proyecto constructivo(Según lo indicado en el Artículo III-1.1 del Pliego)	GL	1	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	1	100,00%				1	100,00%	\$ 25.000,00	
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III-1.2 del Pliego), mínimo 5% del total de la Obra	GL	1	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	1	100,00%				1	100,00%	\$ 40.000,00	
	1.3.1	Cañería de Ø50mm - SDR 11	mts	275	\$ 1.373,00	\$ 377.575,00	268,81	97,75%				268,81	97,75%	\$ 369.076,13	
	1.3.2	Cañería de Ø63mm - SDR 11	mts	90	\$ 1.375,00	\$ 123.750,00	86,45	96,06%				86,45	96,06%	\$ 118.868,75	
	1.4	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (s/ Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 12.676,00	\$ 12.676,00	1	100,00%				1	100,00%	\$ 12.676,00	

EMPRESA CONSTRUCTORA
ING. LUIS A. PEINADO
NICOLAS ALBERTO ITRIA
LEG. 500676

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

OBRA:

"Extensión de red de gas natural a varias calles de Bahía Blanca"

CODIGO DE OBRA: BBL-51-01-19 / BBL-51-02-19

CONTRATISTA: LUIS ALBERTO PEINADO

LOCACION DE OBRA: 4500073894

UNIDAD DE NEGOCIO: BAHIA BLANCA

CENTRO OPERATIVO:

MONTO TOTAL DE OBRA (s/ IVA) \$ 2 089 450 00

BAHIA BLANCA

BAHIA BLANCA

\$ 2,089,450.00

MEDICIÓN / CERTIFICADO N° 3

PERÍODO: Agosto 2019

FECHA: 06/09/2019

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICION ITEM				CERTIFICADO				OBS.	
							ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR \$	ACTUAL \$		ACUMULADO \$
							CANT	%	CANT	%	CANT	%				
7	BBL 51-02-19 ANTEPROYECTO N° 03-006654-00-19															
	1.1	Proyecto constructivo, Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego)	Gl	1	\$ 8.500,00	\$ 8.500,00	1	100,00%			1	100,00%	\$ 8.500,00	\$ 8.500,00		
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III.1.2 del Pliego).	Gl	1	\$ 13.000,00	\$ 13.000,00	1	100,00%			1	100,00%	\$ 13.000,00	\$ 13.000,00		
	1.3.1	Cañería de Ø63mm - SDR 11	mts	117	\$ 1.337,00	\$ 156.429,00	117	100,00%			117	100,00%	\$ 156.429,00	\$ 156.429,00		
	1.4	Prueba neumatica de fuga y de hermeticidad final (sf Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	1	100,00%			1	100,00%	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00		
8	BBL 51-02-19 ANTEPROYECTO N° 03-006625-00-19															
	1.1	Proyecto constructivo, Según lo indicado en el Artículo III.1.1 del Pliego)	Gl	1	\$ 9.000,00	\$ 9.000,00	1	100,00%					\$ 9.000,00	\$ 9.000,00		
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Artículo III.1.2 del Pliego).	Gl	1	\$ 13.000,00	\$ 13.000,00			1	100,00%	1	100,00%	\$ 13.000,00	\$ 13.000,00		
	1.3.1	Cañería de Ø50mm - SDR 11	mts	22	\$ 1.123,00	\$ 24.706,00			23,60	107,27%	23,6	107,27%	\$ 26.502,80	\$ 26.502,80		
	1.3.2	Cañería de Ø63mm - SDR 11	mts	103	\$ 1.350,00	\$ 139.050,00			101,40	98,45%	101,4	98,45%	\$ 136.890,00	\$ 136.890,00		
	1.4	Prueba neumatica de fuga y de hermeticidad final (sf Art. III-1.4 del Pliego)	GL	1	\$ 12.676,00	\$ 12.676,00			1	100,00%	1	100,00%	\$ 12.676,00	\$ 12.676,00		
					TOTAL SIN IVA	\$ 2.089.450,00	AVANCE DE OBRA: 99,74%				\$ 1.894.862,32	\$ 189.068,80	\$ 2.083.931,12			

APROBACION DE LA MEDICION

Fecha: 12/03/19

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

三、

1000

CONTRATISTA

INSPECTOR

NOTES

2016-06-27

APROBACION DEL CERTIFICADO.

18/09/2018

20

REFLECTED

UNIVERSIDAD DE NEGOCIOS RIARCA

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

THE

GERENTE

UNIVERSITY OF MEDICINE, BLANCA

C&M JZZI GAS PAMPEANA S.A
