Camuzzi Gas Pampeana

CERTIFICADO Nº 04 PERIODO: 01/10/17 AL 31/10/17




)ENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA PARA VERIFICACION DE TRABAJOS EN TALLEI

FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. ORDEN DE COMPRAJCONTRATO N°: 4500063217

Item

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

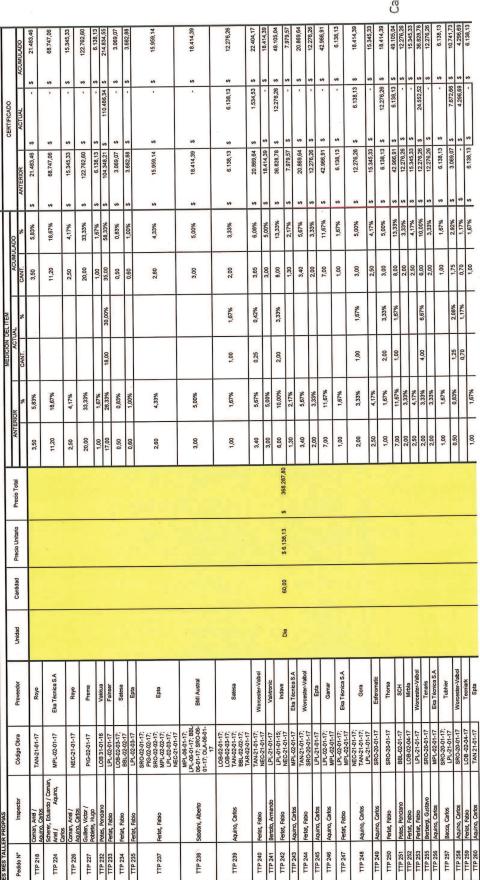

Ing, Efrain Tal Gerencia Técr Depto, de Ob Camuzzi Gas Pamp

Jefe del Depto, de Obras Camuzzi Gas Pampeana RATO SAGULA

1,534,53	202.251,38 \$	696.677,76	244,08% \$	146,45	54,92%	32,95	189,17%	113,50	LER	SUBTOTAL INSPECTORES TALLER	SUBTOTAL INSPECTORES TALL	SUBTOTAL INSPECTORES TALL	SUBTOTAL INSPECTORES TALL
1.534,53	1.534,53 \$	S	0,42%	0,25	0,42%	0,25					Worcester-Valbol	LPL Z1-U1-17 Worcester-Valbol	Irelat, rdxiv
3.069,07	3.069,07	s	0,83%	0,50	0,83%	05'0					Indave	TAN-21-01-17 Indave	Gomez, Fablan TAN-21-01-17 Indave
6.138,13	6.138,13 \$	v3	1,67%	1,00	1,67%	1,00					Mantech	May 23-01-17. MRP 23-01-17. MRP 32-01-17. SRC-30. 01-17. PEH-32- 01-17. PEH-32-01-17. 17.	_

I		-								STATE OF STREET						
0 N 0	-		30	20.000	Cantidad					MEDICIÓN	EDICIÓN DEL ITEM				00101111010	
20	Inspector	Codigo Obra	Proveedor	Unidad	FOCEGAS	Precio Unitario	Precio Total	ANTE	ANTERIOR	ACT	ACTUAL	ACUM	ACUMULADO		CERTIFICADO	
					The second second			CANT.	%		%	CANT	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACHMILI ADO
221	Ferlat, Fabio	Terceros	Specus	d			-	1.00	10.00%			100	10 00%	6 130 13	-	2000
204	Tailot Pakin			Dia	10.00	\$ 6.138,13	\$ 61.381.30		800.01			00'1	0.00%	6.136,13		6.138,13
	relat radio	lerceros	Tecniark				The state of the s			0,30	3,00%	0,30	3,00%		1.841.44	1.841.44
				SUBIOIA	AL INSPECTORES TALLER	IALLER		1,00	40,00%	0,30	3,00%	1,30	13,00%	\$ 6.138,13	1.841,44	7.979,57

TOTAL TERCEROS:

TOTAL PROPIAS:

FIRMAS APROBACION CANUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Ing Efrain Tamara Gerencia Técnica Depto. de Obras Camuzzi Gas Pampeana/Sur

Ipg. SERGIO SAGULA GERENCIA TÉCNICA Jete del Depto, de Obras Camuzzi Gas Pampeana
