



DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA PARA VERIFICACION DE TRABAJOS EN TALLER

Camuzzi Gas Pampeana

CERTIFICADO Nº 08 PERIODO: 01/06/18 AL 30/06/18


FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.		THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	The state of the s
	O N°: 4500063973		SOPIAS

TTP 233 Ferlet, Fabio / Adulto, Carlos Juan Navarrete Juan Navarrete TTP 248 Aquino, Carlos TTP 253 Ferlat, Fabio TTP 254 Daniel Mazzocchi / Carlos TTP 254 Daniel Mazzocchi / Carlos Gabatini (Alfreto, Sabatini Behapini Sabatini Behapini Sabatini Patas Sabatini Mazac Sepeda / Emiliano Monzoi.	Cédigo Obra							-	-						
	Codigo Obra		_	_				MEDICIO	MEDICIÓN DEL ITEM		-				
		Proveedor	Unidad	Cantidad Precto	Unitario Precio Total	ľ	TERIOR	Ą	ACTUAL	ACUMULADO	90		CERTIFICADO		
	- 10 CO 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1		CANT	+	CANT	*	CANT.	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACU	ACUMULADO
	rr-05-01-1/	Fainser				3,00	0 1,67%			3,00	1,67%	\$ 18.600,00	\$ 00	\$	18.600,00
	MPL-32-01-17; TAR-32-01-17; PIG- 32-01-17; SRO-32- 01-17; PEH-32-02- 17; PEH-32-01-17; LOB-32-01-17; CH- 32-01-17; CH-	Marvitech				3000				3,00	1,67%	18.600,00	vs Q	٠	18.600,00
	NEC-21-01-17	Worcester-Valbol]	+			1	1				
	NEC-21-01-17;					3	0,69%			1,25	0.69%	7.750,00	\$ 0	\$	7.750,00
	TAN-21-01-17; LPL- 21-01-17	Gora				8	0.56%			1,00	\$ 895'0	6.200,00	*	49	6.200,00
	LPL-21-01-17	Worcester-Vaibol				090	0 0.28%	r	1	0.50	0.28%	3 100 00	₽		00,000
	SRO-20-01-17	MROYOSACIIFYF				10.50	╁				╁	9	4-	, .	0,00,00
0	Jo / SRO-20-01-17	Tenaris				54.00	 			╁	_	, e		? vs	334.800,00
TTP 257 Quintana / Agsutin Tieri / Carlos Mariscotti	SRO-20-01-17; LPL 21-01-17	Tubhier				00'25	0 31.67%	00.7	3.89%	64,00	35,56% \$	353.400.00	0 \$ 43.400,00	s oc	396.800,00
TTP 263 Gomez, Fabian	TAN-21-01-17	Indave					0.83%	1		5	,,,,,,				
TTP 264 Ferlat, Fabio	LPL 21-01-17	Worcester-Valbol					+	†		\dagger	+	9.300.00		\$	9.300,00
Juan Alejandro Gallardo / TTP 265 Merelo Nicolas / Leandro Potes / Emiliano Moroni / Tomas Mastronandi		MROYOSACIIFYF				43.00				43.00	2,08% \$		s s	s s	23.250,00
TTP 266 Carlos Aquino / Fabio Ferlat	at SRO-20-01-17	Esferomatic S.A.				8.50	4,72%	1,00	0,56%	9,50	5,28% \$	52.700.00	0 \$ 6.200.00	8	58 900 00
	SRO-08-01-18	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.				2,00	1.11%			2,00	1,11%		s		12.400,00
Fabio Feriat	SRO-08-01-18	FAVRA S.A.I.C.				4,00	2.22%			4,00	2,22% \$	24.800,00	\$ 0	s	24.800.00
TTP 272 Scherer	SRO-20-01-17	ARGENTINA S.A.				3,58	1.99%	•	€.	3,58	1,99% \$	22.196,00		s	22.196.00
TTP 273 Eduardo Scherer / Carlos Mariscotti		TUBHER S.A.		(35,50	0 .19,72%			35.50	19,72% \$	220.100.00	s		220 100 00
	SRO-20-01-17	WILDCAT S.A.		_		9	3,33%			t	+		ㅗ	,	100
TTP 277 Fabio Ferlat / Julio Morales	s SRO-08-01-18	INDAVE S.A.		7	Manual of the state of				\		2,22%		s		
TTP 279 Ariel Coman / Eduardo Schener	SRO-08-01-18	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.	<i>T'</i>		<u> </u>	4,25		0000	M MII A	-	2,36% \$	26.350.00		6	26 350 00
TTP280 Gerardo Serrano	SRO-08-01-18	MEIP Ingenieria S.R.L.	IUV Phe	IUV Pheinland Mroenting S	S 6	00.6		TENCIAL TENCIAL	SOCREPINITE TECNICA SOC	+	5 00%	55 800 00	_L	,	olonom-
TTP281 Emiliano Moroni / Julio Morales	LPL-21-01-17	CIMA S.A.	පි	Cdor. Pablo Gera	achty	13.00	1	PTO _O DE	7.22%DFTQgDE QEBAS	\vdash	╁	80.600.00		9 66	95.800,00

AERENCIA TECNICA Veintral Design de Obras Jaintral Base Pampeena

TÜVRheinland®

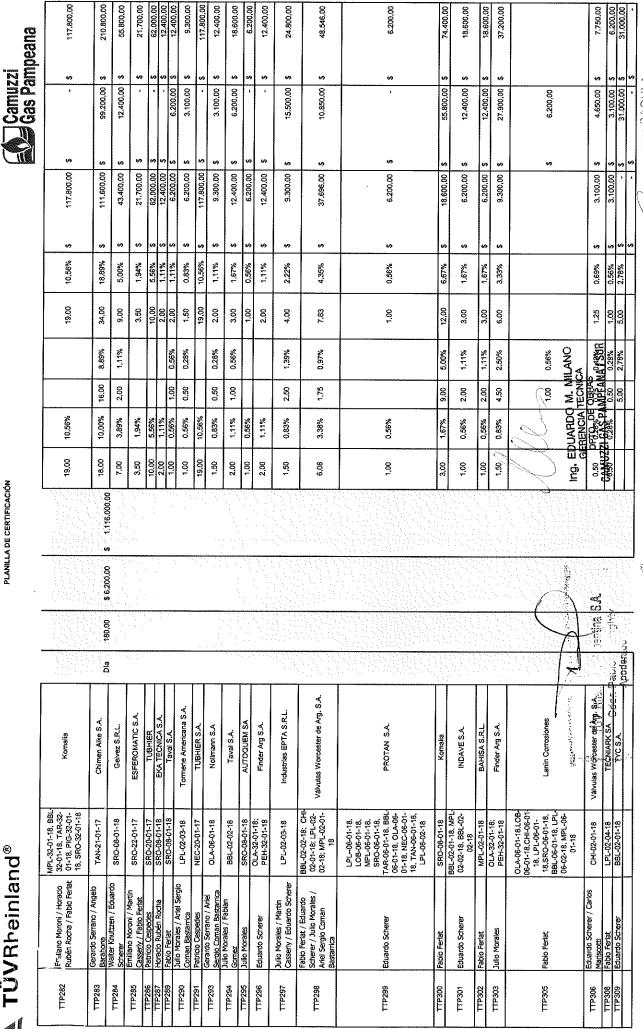

Canusti Sar Permeana PERSONAL TEONION

And the first of the medical designation of the contraction of the con



PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

Camuzzi Gas Pampeana

\$ 365.800,00 \$ 2.600.342,00 32,78% 233,01%

\$ 2.240.742,00 150,59%

TOTAL PROPIAS:

				ľ						
SUBTOTAL INSPECTORES TALLER	328,83	181,02%	59,00	15,56%	356,83	198,24%	\$ 2.240.74	2,00	365.800.00	600 342 00
								_		

		DQ.	ACIMILADO	5	. \$ 6200 00		00'000'6 \$ -	9 300 00	,	- \$ 6.200,00	3.100.00 \$ 6.200.00	69
		CERTIFICADO	ACTUAL	8	s		s s	6	,	ss.	3	s
			ANTERIOR	21.700.00	6.200.00		9.300,00	6.200.00		6.200,00	3.100,00	
f		o	88	5,83%	3,491	1	2.50%	4.17%		0.56%	\$ %95'0	<u>"</u>
		ACUMULADO	CANT.	3,50 5,	1,00	t	1,50 2.	2.50 4.	+	1,00	1,00 0,1	
-	DEL, ITEM	AL	%			\dagger		2,50%			0.83%	
_	MEDICIÓN DEL ITEM	ACTUAL	CANT.			+		1,50	+		0.50	
			%	5,83%	1,67%		2.50%	1,67%		, p/%	0.83%	
F		ANTERIOR	CANT.	3,50	1.00		20,	0.1		39.	0,50	
		lo Precio Total						3/2.000,00				
		Precio Unitar				1.	00.0000	00'007				
		Z						•	-			4
		Cantida				1	00.00	3				
Щ		Unidad Cantidad Precio Unitario					9008					
		Proveedor Unidad Cantida		Senalizacion Integral S.R.L.	GUAYABERA S.A.	VALVULAS WORCESTER DE			JOSE CURI ANTIN E HILDS IN A	VAlvalor Western	valvuda vyolcester de Alg. o.A.	
		Proveedor	+	IERCEROS Senalización Integral S.R.L.	TERCEROS GUAYABERA S.A.	TERCEROS VALVULAS WORCESTER DE	ARGENTINA S.A.	i	TERCEROS JOSE CURI ANTIJN E HIJOS S. A	\dagger	+	
ER JERCEROS		Codigo Cara	+	ODENOTED OF STREET	TERCEROS	_	ARGENTINA S.A.	TERCEROS A. Marshall Moffat S.A.	xha / TERCEROS	╁	2000	
INSPECTORES MES TALLER TERCEROS		Proveedor Proveedor		Amanda Batala / Educado	TERCEROS	TERCEROS	Gerardo Serrano / Marcho	TERCEROS A. Marshall Moffat S.A.	xha / TERCEROS	TEPCEBOS		

\$ 1.488.000,00 TOTAL CONTRATO:

378.200,00 \$ 2.665.442,00 25,42% 179,13% \$ 2.293.442,00 \$

65.100,00

\$ 12.400,00 \$

52.700,00

TOTAL TERCEROS:

Liv Aneiniand Argantina S.A. Cdor, Pablo Geraghty Apoderado

The comment fortion

TOTAL CERTIFICADO AVANCE DEL CONTRATO

FIRMA PROVEEDOR

ing. EDUARDO M. MILANO GERENCIA TECNICA DPTO. DE OBRAS CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR

FIRMAS APROBACION CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

GERENCIA TECNICA ALEJANDRO LORENZO Jeje dal Depto, de Obras Gerennia Tecnico Demina de Cambra de Cambra de Cambrana Destrucció Cas Pampeana STATIO SAGULA
