Camuzzi Gas Pampeana S.A. AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147 (C1107AAF) CAPITAL FEDERAL CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. SAN JOSE - PISO 7° 83 1076 CAPITAL FEDERAL

## **ORDEN DE PAGO**

Fecha de pago 04.10.2018 Documento de pago 2000024945 Proveedor nro. 7584

1 / 1 Página

Documento Factura Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600006889 FA 0010A00051252 04.10.2018	3,686,095.22	677,697.73	3,008,397.49
TOTAL GENERAL	3,686,095.22	677,697.73	3,008,397.49

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	



DENOMINANCIÓN DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCIÓN CALIFICADA PARA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EN TALLER

FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

fern

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

3.465,15 72.768,05 10.395,44 25.988,59 27.721,16 20.790,87 6.930,29 374.235.66 485.120,30 298.002,47 72.768,05 13.860,58 24.810,44 246.025.30 29.453,73 20.790,87 8.662,86 ACUMULADO <del>()</del> 6.930,29 41.581,74 CERTIFICADO 10.395,44 3,465,15 374.235.66 443.538,56 298.002,47 65.837,76 13.860,58 27.721,16 24.810.44 246.025.30 29.453,73 72.768,05 20.790.87 6.930,29 20.790,87 3.662,86 23.89% 2,22% 19,72% 2.36% 38,89% 2,08% 1,11% 1,99% 30,00% 5.83% 3,33% 2,22% 0,28% 5,83% 1,67% 0.56% 1,67% %69.0 CANT. % 35,50 10,50 10,50 43,00 2,00 3,58 6,00 4,00 4,25 54,00 70.00 1,50 3,75 4,00 3,00 8, 0,50 3,00 125 MEDICIÓN DEL ITEN 0.56% 3,33% CANT. % 6.00 8 23,89% 0.69% 0,56% 0,28% 5,83% 30,00% 35,56% 0,83% 2,08% 5,28% 1.11% 2.22% 1.99% 19,72% 3,33% 2,22% 2.36% 1.67% ANTERIOR CANT. % 10,50 35.50 **2** 8 **2**, 8.9 4.25 43.00 5,00 4,00 3,58 6.00 ر. الح 3,75 9 20 3.00 3.00 1,25 8 0.50 Precio Total Precio Unitarlo Cantidad Unidad VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A. MEIP Ingenieria S.R.L. FAVRA S.A.I.C. VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A. VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A. MROYOSACIIFYE MROYOSACIIFYF Worcester-Vaibol Esferomatic S.A. Worcester-Valbol TUBHIER S.A. INDAVE S.A. WILDCAT S.A Proveedor Marvitech Tubhier Fainser Indave Gora NEC-21-01-17 NEC-21-01-17; TAN-21-01-17; LPL-21-01-17 TAR-32-01-17; PIG-32-01-17; PIG-32-01-17; PEH-32-01-17; PEH-32-01-17; PEH-32-01-17; CH-32-01-17; SRO-20-01-17; LPL 21-01-17 SRO-08-01-18 SRO-08-01-18 SRO-20-01-17 SRO-08-01-18 SRO-20-01-17 NEC-20-01-17 SRO-20-01-17 TAN-21-01-17 SRO-08-01-18 MPL-32-01-17; SRO-20-01-17 SR020-01-17 Cédigo Obra LPL-21-01-17 LPL 21-01-17 LPL-02-01-17 Daniel Mazzocchi / Carlos Aguino / Alfredo Sabatini Berbergi, Gustavo / Alfredo Sabatini / Matas Cepeda / Carlos Aquino / Fabio Ferlat Eduardo Scherer / Francisco Fabio Ferlat / Julio Morales Quintana / Agsutin Tieri / Merelo Nicolas / Leandro Potes / Emiliano Moroni / Scherer Eduardo Scherer / Carlos Ferlat, Fabio Juan Alejandro Gallardo Ariel Coman / Eduardo Fabio Ferlat Fabio Ferlat / Eduardo ORDEN DE COMPRA/CONTRATO Nº: 4500063973 omas Mastronardi Inspector Carlos Maríscotti Gomez, Fablan Juan Navarrete Ferlat, Fabio / Aquino, Carlos Aquino, Carlos Ferlat, Fabio Fabio Ferlat TORES MES TALLER PROPIAS Fabio Feriat TTP 263 TTP 264 TTP 266 TTP 253 TTP 254 TTP 255 TTP 257 TTP 276 Pedido Nº TTP240 TTP 248 TTP 265 TTP 270 TTP 272 TTP 273 TTP 277 TTP 279 TTP 233 TTP 271

ING. EDUARDO M. MILANO SEFENTE TEOMOS
GERENCIA TECNICA
GERENCIA TECNICA
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR
CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

124.745,22

27.721,16

97.024,06, \$

62.372,61

5,00% 10,00%

9,00

18,00

2,22%

4,00

7,78%

14,00

1

CIMA S.A.

LPL-21-01-17

SRO-08-01-18

Gerardo Serrano Emiliano Moroni / Julio

TTP280

TTP281

V Rheimant Argentina S.A. Cdor. Pablo Geneghty

TUV Rheimant

Appagerado

70 0

5,00%

00 6

62.372.6


Camuzzi Gas Pampeana

PERIODO: 01/07/18 AL 31/07/18

CERTIFICADO Nº 09

Camuzzi Gas Pampeana



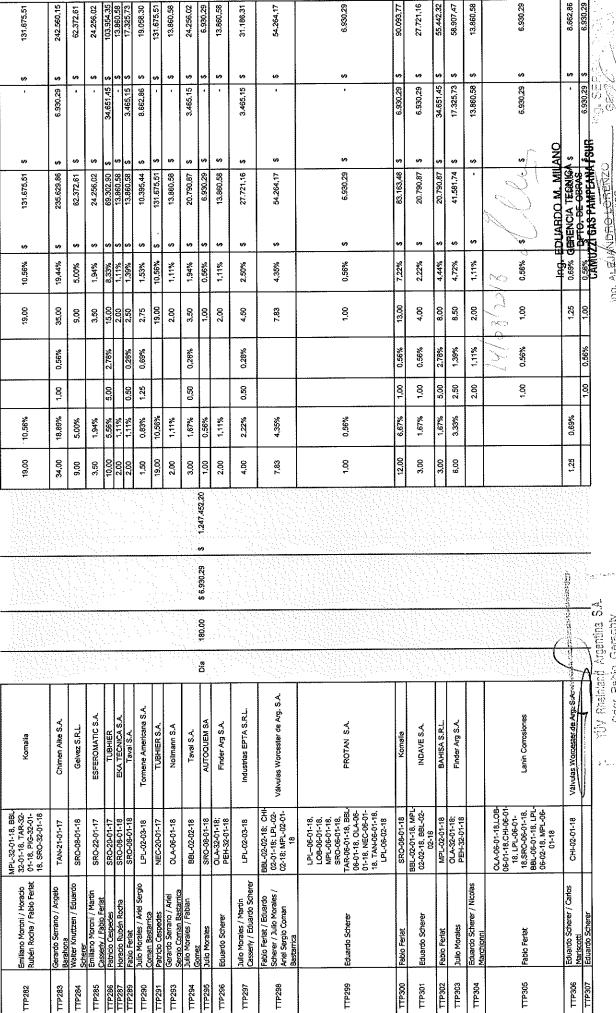

rüy Asəlmanğ Argentina S.A. Odor, Pablo Geraghty Applemento

Cil Bas Panyeane ING. ALEUNNOFOLOMENZO

いんきょうぎんぶ



w	69	69	÷	s	\$	s	49	69	s	છ	\$	s	69	\$
	27.721.16	13.860,58	17,325,73	34.651,45	13.860,58	1.732,57	1.732,57	8.662.86	6.930.29	6.930,29	6.930,29	6,930,29	•	377.700,81
s,	s	vs	s	s	s	s	s	\$	69	s	s	s	69	٠,
6.930,29	34.651,45	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2.906.632,93
<i>γ</i>	8	<del>ده</del> «	.o	<b>69</b>	\$ ,	9	<i>\$</i>	\$	φ	\$	£9 %	\$9 %	\$	s %
0.56%	5.00%	1,11%	1,399	2,78%	1,11%	0,14%	0,14%	%69%	%95'0	0,56%	0,56%	0.56%		207,96%
1,00	9,00	2,00	2,50	5,00	2,00	0,25	0,25	1,25	1,00	1,00	1,00	1,00		374,33
	2,22%	1,11%	1,39%	2,78%	1,11%	0,14%	0.14%	0,69%	0,56%	0.56%	0.56%	%95'0		9,72%
	4,00	2,00	2,50	5,00	2,00	0.25	0,25	1,25	1,00	1,00	6.	1,00		54,50
%95'0	2,78%													196,57%
00.1	5,00													356,83
														ALLER
						1.5		. 114 1111			5.44			ST,
														TAL INSPECTORES TA
														SUBTOTAL INSPECTORES TALLER
														SUBTOTAL INSPECTORES TA
TECNIARK SA	TYC S.A.	Consordio: AESA Constructiones y Servicios S.A.	VALVTRONIC S.A	VALVTRONIC S.A	ESFEROMATIC S.A.	AUTOQUEM	EKA TECNICA S.A.	EKA TECNICA S.A.	BMI Austral S.R.L.	MIRBLA S.A.	AUTOQUEM	Gelvez S.R.L.		SUBTOTAL INSPECTORES TO
LPL-02-04-18 TECNIARK SA			BBL-02-01-18 VALVTRONIC S.A		MPL-02-01-18 ESFEROMATIC S.A.	LPL-02-03-18 AUTOQUEM	LPL-02-02-16, CHI- EKA TECNICA S.A. 02-01-18		LPL-06-01-18, LOB-06-01-18, DLA-06-01-18, BMI Austral S.R.L. S.RO-06-01-18, LPL-06-01-18, LPL-0	LPL-02-04-18 MIRBLA S.A.				SUBTOTAL INSPECTORES TO
	nerer BBL-02-01-18 TYC S.A.	Consorcio: AESA Construcciones y Servicios S.A.		NEC-09-01-18		chionni LPL-02-03-18	LPL-02-02-16, CHI- 02-01-18				ni LPL-02-03-18	LPL-02-02-18		SUBTOTAL INSPECTORES T

1,732,57

8.662,86

6.930,29

13.860,58 1.732,57

13.860,58

Cy Camuzzi Gas Pampeana

rctor ( In / Eduardo   1 In / Eduardo	TERCEROS   Proveedor   Unidad   Precio Unitario   Precio Total   ANTERIOR   MEDICION DELITEM   MEDICION DE													, 104	0410000	1.1.	\$ 2.906.632,93	\$ 377.700,81	\$ 3.284.333,73
ctor         Código Obra         Proveedor         Unidad         Practio Unitario         Practio Unitario U	cctor         Código Obra         Proveedor         Unidad         Cantidad         Precio Unitario         Precio Total         ANTERIOR         ACANT.         %         CANT.         %         ANT.         ANT.         ANT.         ANT.         ANT.         ANT.         ANT.         ANT. <t< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>5</th><th>L PROPIAS</th><th></th><th>174,75%</th><th></th><th>263,28</th></t<>													5	L PROPIAS		174,75%		263,28
Codigo Obra   Proveedor   Unidad   Cantidad   Precio Unitario   Precio Total   Antecio No. Sefalizacion Integral S.R.L.   Cant.   S.C. Cant.   S.C	Codigo Obra   Proveedor   Unidad   Precio Unitario   Precio Total   ANTERIOR   ANTERIOR   ACTUAL   CANT. S. C	ូ	DRES MES TALLS	ER TERCEROS										-		-			
Pedido N°   Inspector   Codigo Obra   Proveedor   Inspector   Inspec	Pedido N°         Inspector         Código Obra         Proveedor         Unidad         Cantidad         Precio Ontal         Precio Otdal         ANTERIOR         ACTUAL         ACTUAL           TTP 268         Carlos Aquino         TERCEROS         Sefalización Integral S.P.L.         G. ANT. S.A.         S.S.S. S.A.         3.50         5.83%         P.S.S.A.         3.50         5.83%         P.S.S.A.         P.S	1										1	MEDICION	DEL ITEM				Coscination	
Carino Aguino   TERCEROS   Sefralizacion Integral S.R.L.   Cant.   S. Cant.	Carios Aquino   TERCEROS   Señalización Integral S.R.L.   S.60	=	Pedido Nº	Inspector	Código Obra	Proveedor	Unidad	Cantidad P.	recto Unitario	Precio Total	ANTE	ľ	ACTU	AL.	ACUMUL	ĝ			
Cartos Aguino   TERCEROS   Señalización Integral S. P.L.   Armando Betrol / Eduardo   TERCEROS   Señalización Integral S. P.L.   1.00   1.67%   5.89	Carlos Aquino   TERCEROS   Señalización Integral S.R.L.   Armando Bertolo / Eduardo   TERCEROS   GUAYABERA S.A.   Scheer   1.00   1.67%   Scheer   1.00   Scheer   1			_							CANT.	8	CANT.	H	CANT.	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
Armando Betto/ Eduardo         TEKCEROS         GUAVABERA S.A.         1.00         1.67%         1.50         2.50%         1.50         1.50         2.50%         1.50         2.50%         2.50%         3.50% <t< td=""><td>Armando Bertol / Eduardo         TERCEROS         GUAVABERA S.A.         1,60         1,67%         1           Scheer         Scheer         Fablo Ferlat / Ariel Coman         TERCEROS         A. Marshall Moffat S.A.         Dia         60,00         \$ 6.930,29         \$ 415,817,40         2.50         4.17%         1           Gerardo Serrano / Martin         TERCEROS         A. Marshall Moffat S.A.         Dia         60,00         \$ 6.930,29         \$ 415,817,40         1.00         1,67%         1           Horacio Ruben Rocha / Gerardo Scherer         TERCEROS         Válvulas Worcester de Arg. S.A.         A Marshall Moffat S.A.         Bernar         1.00         1,67%         1         1,77         2,92%           Leandro Gomez / Luciano         TERCEROS         A Marshall Moffat S.A.         Bernar         Bernar         10,50         17,50%         2,25         3,75%</td><td>1</td><td>TTP 268</td><td>Carlos Aquino</td><td>TERCEROS</td><td>Señalizacion Integral S.R.L.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,50</td><td>5.83%</td><td>-</td><td></td><td>3,50</td><td>5.83%</td><td></td><td></td><td></td></t<>	Armando Bertol / Eduardo         TERCEROS         GUAVABERA S.A.         1,60         1,67%         1           Scheer         Scheer         Fablo Ferlat / Ariel Coman         TERCEROS         A. Marshall Moffat S.A.         Dia         60,00         \$ 6.930,29         \$ 415,817,40         2.50         4.17%         1           Gerardo Serrano / Martin         TERCEROS         A. Marshall Moffat S.A.         Dia         60,00         \$ 6.930,29         \$ 415,817,40         1.00         1,67%         1           Horacio Ruben Rocha / Gerardo Scherer         TERCEROS         Válvulas Worcester de Arg. S.A.         A Marshall Moffat S.A.         Bernar         1.00         1,67%         1         1,77         2,92%           Leandro Gomez / Luciano         TERCEROS         A Marshall Moffat S.A.         Bernar         Bernar         10,50         17,50%         2,25         3,75%	1	TTP 268	Carlos Aquino	TERCEROS	Señalizacion Integral S.R.L.					3,50	5.83%	-		3,50	5.83%			
Pable Ferlat / Ariel Coman   TERCEROS   VALVULAS WORCESTER DE   Ariang	Pable Ferlat / Ariel Coman   TERCEROS   VALVULAS WORGESTER DE   A. Marshall Moffat S.A.   Cerando Serrano / Martín   TERCEROS   A. Marshall Moffat S.A.   Educardo Schredo   TERCEROS   A. Marshall Moffat S.A.   Substitute   Marshall Moffat S.A.   Educardo Schredo   TERCEROS   Esteromatic S.A.   Substitute   TERCEROS   Esteromatic S.A.   Substitute   TERCEROS   Esteromatic S.A.   Substitute   TERCEROS   TERCERO		TTP 274	Armando Bertolo / Eduardo Scherer	TERCEROS	GUAYABERA S.A.					1,00	1,67%			1,00	1.67%	\$ 6.930,29	\$	
Cerardo Serrano / Martín   Terceros   A. Martini Moffat S.A.   Dia   66.00   \$ 6.390.29   \$ 4.15 M   Tencero Servano / Martín   Tencero Servano / Martín   Tencero Servano / Martíni Moffat S.A.   Dia   6.00   \$ 6.390.29   \$ 6	Gerardo Serrano / Martín   Terceros A, Marshall Moffat S.A.   Día 60,000   \$ 6,930,29   \$ 415,817.40   1.67%   1.07%		TTP 278	Fabio Ferlat / Arlel Coman	TERCEROS	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.					1,50	2,50%			1,50	2,50%	\$ 10.395,44		\$ 10.395,
Horacio Rubén Rocha / TERCEROS   JOSE CURI ANTUNE HULOS S.A.   Horacio Rubén Rocha / Las   Horacio Rubén Rocha / Las   Leader Control Ruben Rocha / Leader Control Record Scheer   Leader Control Record Rec	Horacio Rubén Roche / TERCEROS JOSE CURI ANTUN E HJUOS S.A.   Gendo Sertano   1.00 1.67%   1.00 1.67%   1.00   1.00   1.00		TTP292	Gerardo Serrano / Martin Casserty / Fablan Gomez	TERCEROS	A, Marshall Moffat S.A.			\$ 6 930 29	\$ 415,817.40	2,50	4,17%			2,50	4,17%		,	·
Eduardo Scheer   TERCEROS   Válvulas Worcester de Arg. S.A.   Eduardo Scheer   TERCEROS   TERCEROS   Válvulas Worcester de Arg. S.A.   1,75   2,92%   1,75   2,92%   2,92%   3,75%	Eduardo Scherer   TERCEROS   Válvulas Wordester de Arg. S.A.   1.00 1,67%   1.75 2.92%		TTP288	Horacio Rubén Rocha / Gerardo Serrano	TERCEROS	JOSE CURI ANTUN E HIJOS S.A.	* * * * *				1,00	1,67%			1.00	0.56%			
Leandro Gomez / Luciano   TERCEROS   A. Marshall Moffat S.A.   A. Ma	Leandro Gomez / Luciano   TERCERCS   A. Marshall Moffat S.A.   1,75   2,92%		TTP307	Eduardo Scherer	TERCEROS	Válvulas Worcester de Arg. S.A.					1.00	1,67%			1,00	0.56%		-	
Osvaldo Chapda         TERCEROS         Esteromatic S.A.         National Chapter	Osciolo Chapela         TERCEROS         Esferomatic S.A.         SUBTOTAL INSPECTORES TALLER         10,50         17,50%         2,25         3,75%		TTP313	Leandro Gomez / Luciano Beimar	TERCEROS	A. Marshall Moffat S.A.								2,92%	1,75	2,92%			Ì
SUBTOTAL INSPECTORES TALLER 10,50 17,50% 2,25 3,75% 12,75 19,03% \$ 72,768,05 \$ 15,593,15 \$	SUBTOTAL INSPECTORES TALLER 10,50 17,50% 2,25 3,75%		TTP320	Osvaldo Chapela	TERCEROS	Esferomatic S.A.								0,83%	0,50	0.83%	- 8		\$ 3.465
SUBTOTAL INSPECTORES TALLER 10,50 17,50% 1,25 3,75% 12,75 19,03% \$ 72,768,05 \$ 15.593,15 \$	SUBTOTAL INSPECTORES TALLER 10,50 17,50% 2,25 3,75%					(											€9		€9
		ı					1	SUBTOTAL I		TALLER	10,50	17,50%	ļ	3,75%	12,75	19,03%	\$ 72.768,05	\$	\$ 88.361

3,284,333,73

Ing. EDUARDO M. MILANO GENENCIA TECNICA DPTO. DE OBRAS CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

The state of the s

ffly Rheinland Argentina S.A. Coor, Pebro Geraghty Apodorado

18. 4/E/ANDEDITORENZO

Ang, Suhitio parkitura gerrandia Téonida jari de Sam de Octob Saminzi (898, Parigeans

88.361,20 21,25%

3,75%

\$ 72.768,05 17,50%

TOTAL TERCEROS:

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

Comuzzi Gas Pampeana

\$ 1.663.269,60 TOTAL CONTRATO:

\$ 2.979.400,97 \$

393.293,96 \$ 3.372.694,93 23,65% 202,78% 179,13%

16/02/2013

The state of the state of

TOTAL CERTIFICADO AVANCE DEL CONTRATO

ปัง Ansintand Argentina S.A. Cidox Pablo Genaghiy Apadomado

FIRMA PROVEEDOR

FIRMAS APROBACION CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

ING. EDUARDO M. MILANO GERENCIA TECNICA DPTO. DE OBRAS DATOS GAS PAMPEANA I SUR CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

Ang. CHROID CAGULA GERENCIA TECNICA Jero del Depto, de Oriss Cerrigio Ses Perrosara

ing, ALEJANDRO LOBENZO





Nº 0010 - 00051252

## **Factura**

Fecha: 14.08.2018 Página:1 de 1 Original

TÜV Rheinland Argentina S.A.

San Jose 83 - 7º Piso - C1076AAA

Tel/Fax: +54 11 4372-5033 Buenos Aires - Argentina

e-mail: tuv-argentina@ar.tuv.com

CUIT: 30-67775453-9

ING.BRUTOS: C.M. 904164707-7 INICIO DE ACTIVIDADES: 08/02/94 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SR/ES: CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A

**DIRECCION:** a Moreau de Justo 240 p3 - Ciudad de Buenos Aires

CP(1107) Argentina

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT: 30657864281

CONDICION DE VENTA: hasta 45 días - Fecha Factura

**SU REFERENCIA**: 700-17-0030 - OBRA

NUESTRA REFERENCIA: 42400631 / 120258227

DESCRIPCION PRECIO TOTAL

Servicios:

Servicios Técnicos de Inspección DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP.#FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGE NTINA S.A.#CERTIFICADO Nº 09#PERIODO: 01/07/18 AL 31/07/18#ORDEN DE COMPRA/CONTRATO Nº: 4500063956 3.041.332,69

Emitir cheques a la orden de TÜV Rheinland Argentina S.A. o Transferencia

Electrónica

Cuenta corriente Banco Santander Río S.A. (Sucursal Once) Nº 044-0020682

Razon Social: TÜV Rheinland Argentina S.A.

 $N^{o} \text{ C.U.I.T. } 30\text{-}67775453\text{-}9 \\ \text{CBU } N^{o} \text{ } 0720044120000000206822 \\$ 

Las partes acuerdan la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la Nación con relación a la presente relación comercial

SUBTOTAL: IMPUESTO:

SUBTOTAL: IVA (21,00%):

IIBB Percepc. CABA (0,20%):

TOTAL (PESOS):

3.041.332,69

3.041.332,69 638.679.86

6.082,67 3.686.095,22

Son ( PESOS ): TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CINCO con 22 / 100



3067775453901001068339786655352201808241 CAE: 68339786655352 Fecha Venc.: 24.08.2018
